

中小企業總會經濟部新創採購網維運案 專案執行計劃書

中華民國 114 年 06 月

八拍子股份有限公司

v.0.1

簽核

委託單位	社團法人中華民國 全國中小企業總會	執行單位	八拍子股份有限公司
委託方聯絡人	蘇柏叡	專案管理人	白家宇、林愛馨
簽章		簽章	

版本紀錄

日期	版本	內容	修訂
2025/06/12	1.0	初版	白家宇、林愛馨

中小企業總會經濟部新創採購網維運案 專案執行計劃書	1
第壹章 計畫目標	4
(一) 計畫緣起	4
(二) 預期產出	4
第貳章 專案假設	7
(一) 技術機制及條件限制之假設	7
(二) 專案一般假設	7
(三) 其他廠商資訊與配合事項	8
(四) 專案階段規劃	8
(五) 專案工作項目劃分、階段產出	8
(六) 專案工作項目列表	9
第參章 品質管控	11
(一) 資安控管措施	11
(二) 專案品質管控	12
(三) 技術及資安風險基準	13
第肆章 執行時程規劃與成本控制	16
(一) 期程規劃	16
(二) 詳細工作期程表	17
(三) 交付項目表	18
附件	19
專案需求變更程序	19

第壹章 計畫目標

(一) 計畫緣起

本案主要維護目標為確保平台運作穩定，並持續符合資安要求與政府資訊無障礙標章標準，提供所有使用者包含新創業者、公部門單位及一般民眾良好的使用體驗。同時，因應實務使用回饋與政策推動需求，將進行部分頁面的視覺與功能微調，確保平台資訊傳遞效率與操作友善性。此次除了延續既有平台的開發邏輯與架構外，也將進一步針對潛在風險進行預防性維運，提升部署效率與維護品質，協助中小企業總會穩定支援經濟部新創政策的執行。

此設計開發與時程規劃皆為專案可儘早實行須供之初步架構，實際功能設計可能會根據專案進展進行調整。

(二) 預期產出

#	產出項目	敘述	備註
1	基礎維運	- 網站內容日常維護與運作 - 維護至2025年12月31日止	
2	部署作業	- 委託方協助把現有 www.spp.org.tw 網域的 DNS 改指到八拍子的機器 IP - 部署：目前放在 數位通國際雲端服務部署 - 雲端正式主機 VM Ware 由 Rytass 負責進入維護 - 執行時間：10月時搬到 GCP (Google Cloud Platform)	
3	網址轉移	由中小企總採購網現為 www.spp.org.tw/spp/ 併入新創圓夢網 https://startup.sme.gov.tw/home/	
4	維護紀錄	進行系統日常維護紀錄報告	
5	系統備份	系統於 GCP (2025/06 – 12 月) 維運期間自動備份，將截圖證明	
6	還原演練	於部署至 GCP 以後，共計 1 次	
7	網站憑證管理 (SSL憑證安裝)	為「新創採購」網站安裝指定SSL/TLS憑證： - 目標網站：新創採購網站。 - 憑證來源：中華電信 或臺灣網路認證股份有限公司。 - 執行內容：於指定的網站伺服器上完成憑證安裝、相關設定與功能測試。	

#	產出項目	敘述	備註
8	弱點掃描報告	- 於維護期間，定期進行弱點掃描，並對中、高度風險進行調整，排除因現有程式 PHP 5.6.40 版本所造成的風險、漏洞不進行修補。 - 本專案進行共 2 次弱點掃描。 - 交付形式：掃描報告電子檔。	- 資通系統防護需求分級：普級 - 弱點掃描（黑箱）：Rytass ZAP 掃描需提供給委託方 - 源碼掃描（白箱）：Rytass（內部基本規範）
9	無障礙未通過項目修復		
10	無障礙掃描報告	- 維持網站符合「無障礙網頁開發規範」等級 AA 之要求，並更新標章。 - 具體要求： - 確保影片內容提供字幕。 - 確保非文字性內容（如：圖片、圖表、表格）提供適當的替代文字說明。 - 標章申請與維護： - 配合「我的 E 政府」網站的複測申請流程，提交申請並通過檢測。 - 若複測未通過，需根據複測結果進行修正，直至通過為止。 - 最終目標為取得並持續維持有效的無障礙網頁標章。 - 交付形式：無障礙掃描報告電子檔。	
11	在前台加入 Chatbot iframe	請委託方提供 iframe 程式碼	
12	前台靜態頁面調整	協助委託方調整後台無法調整的前台靜態文字	

#	產出項目	敘述	備註
13	網站內容管理 (頁面下架)	執行內容： • 確保指定頁面自網站前台移除，使用者無法再瀏覽。 • 檢查並同步調整網站內相關的超連結、選單項目、網站地圖 (Sitemap) 等，避免出現無效連結。 • 確保下架過程平順且安全，不得影響網站其他正常功能。	下架頁面為： • https://www.spp.org.tw/spp/subsidy/1 • https://www.spp.org.tw/spp/subsidy/2 • https://www.spp.org.tw/spp/subsidy/3 • 最新消息-機關補助 (左側選單隱藏) https://www.spp.org.tw/spp/sppnews?type=6 • 補助採購 (欄位移除) https://www.spp.org.tw/spp/sppsitemap • 首頁「補助採購」方框移除 https://www.spp.org.tw/spp/

第貳章 專案假設

本計畫書是基於下列主要假設規劃專案執行建議。任何假設不成立狀況下，將影響專案導入費用和時程，將依照專案需求變更控制程序¹（Project Change Control Procedure）處理。

（一）技術機制及條件限制之假設

以下攸關本案專案風險控管之項目，於本服務建議書撰寫並遞送委託方前，因尚未能與委託方釐清之項目，故假設以下項目皆確實存在且能順利支持本案進行，如因下述問題造成專案風險或時程增加，則委託方需積極協調專案風險項目，雙方並依照專案變更控制程序處理：

1. 組織與合作架構

- 本專案各階段的決策層級包含高階主管、專案主持人、資訊部門，專案期間相關工作決策皆能如期進行。
- 委託方決策期程如造成專案延宕，不計入專案時程。

2. 既存規範

- 本案須符合之資安規範，包含但不限於：ISMS 規範、《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》所衍生之資料管理與各類資通訊安全審核流程等。委託方資安審核期程如造成專案延宕，不計入專案時程。

（二）專案一般假設

- 專案執行將以此工作時程（例假日及國定假日除外，週一至週五為早上 10 時至下午 7 時）提供服務；若有另外非上班時間或要求時間服務之加班需求，經雙方專案經理同意後執行。
- 若委託方無法依專案計畫之約定提供資源，甲乙雙方將依專案變更管理程序處理，因此所產生之額外費用由委託方支付予 Rytass。
- 委託方需盡力協助確認提供資料的品質、即時性與完整性，以利維持專案執行進度。
- 本專案甲乙雙方專案經理將於每月共同審察工作進度，Rytass 將於專案執行期間每月透過 Email 寄送系統維護記錄表供委託方查閱。若有任何因素所導致之進度落後，由雙方開會協商處理方式並依雙方確認後之共識決定之。

¹ 見附件。

（三）其他廠商資訊與配合事項

若專案中牽涉到其他廠商，如軟硬體、資料庫廠商等，委託方將協助盡力確保第三方廠商配合，並盡力協調其他廠商達成與本專案相關之配合。

（四）專案階段規劃

本專案導入方法將依 Rytass 專案管理辦法進行，專案性質為現有系統之維運、環境遷移及功能調整作業，屬於後續擴充與資安、無障礙維持任務，執行階段將包含以下管理項目為主：

- 專案啟動：針對維運與遷移項目進行工作項目確認與期程規劃
- 工程環境建置：包含 GCP 環境部署、備份機制建置、SSL 安裝、網址跳轉設定等
- 系統工程開發：針對部署遷移、靜態內容管理功能改善及 Chatbot 嵌入等進行必要之系統調整
- SIT 系統整合測試：針對遷移後網站運作、網址跳轉、備份與新功能整合進行測試
- UAT 使用者測試：包含功能驗收、無障礙複測及掃描報告確認
- 系統保固與維運

（五）專案工作項目劃分、階段產出

對於 Rytass 交付委託方審閱之專案相關文件，委託方應詳盡審視，如有異議得於 7 個工作日內提出；若超過 7 個工作日未提出任何異議，為免專案進度停滯或受到影響，將視同對此交付文件無異議，Rytass 將繼續進行後續之專案工作。超過 7 個工作日之審閱期後，交付文件如需修改，且可能對專案時程造成影響時，需依專案變更管理程序辦理。專案執行過程中提供文件皆以繁體中文呈現，若需其他語言版本翻譯文件由委託方執行之。

(六) 專案工作項目列表

#	工作項目	預計人天				備註
		FE	BE	SRE	PM	
1	下架網頁x3、欄位內容x3		4			2025/4/29 完成
2	工作企劃書				4	
3	(i5-05) 網站憑證管理 (SSL憑證安裝)			0.5	0.5	2025/6/2 完成
4	(i5-01) 部署至 GCP (2025/05/31 - 2025/12/31)			1	0.5	2025/5/31 完成
5	(i5-02) 網址轉移至新創圓夢網			0.5	0.25	
6	(i5-03-1) 系統備份紀錄-六月		0.25		0.25	
7	(i5-03-2) 系統備份紀錄-七月		0.25		0.25	
8	(i5-03-3) 系統備份紀錄-八月		0.25		0.25	
9	(i5-03-4) 系統備份紀錄-九月		0.25		0.25	
10	(i5-03-5) 系統備份紀錄-十月		0.25		0.25	
11	(i5-04) 還原演練-上 GCP 後		0.5		0.5	
12	(i5-06-1) 弱點掃描報告 I		0.5		0.5	
13	(i5-06-2) 弱點掃描報告 II		0.5		0.5	
14	(i5-07) 無障礙掃描報告		1		0.5	
15	(無障礙) HM1130104C:可見的表單控制元件均需有對應的標籤<label>組件，或有標題(title)屬性，且其內容或值均不得為空字串或空白		0.5		0.25	
16	(無障礙) HM1130100C:網頁中的標頭組件必須要按照正確的巢狀層次結構來配置		2		0.25	
17	(無障礙) CS2140401C:任何CSS樣式規則均使用具名字型尺寸，或者使用百分比或em等相對字型尺寸單位		1		0.25	
18	(無障礙) HM1310100C:網頁根組件需有語言(lang)屬性，且其值必須合於規範，不得為空字串或空白		0.5		0.25	
19	(i5-08) 在前台加入 Chatbot iframe		2		0.5	
20	(b5-01) 後台無法刪除項目		1		0.25	
21	(b5-02) 出題檔案於前臺下載連結無效		0.5		0.25	
22	(b5-03) 前後台顯示類型名稱不一致		0.5		0.25	
23	(i5-09) Footer 聯絡資訊更新	0.5		0.5	0.25	
24	(i5-10) 網站憑證管理 (SSL憑證安裝)，轉址新創圓夢網後再一次		0.5	1	0.5	

#	工作項目	預計人天				備註
		FE	BE	SRE	PM	
25	(i5-11) 出題解題連結網址替換	0.5			0.25	使用彈性人天
26	彈性人天	2	0.5	0.5	2	

- 本案基礎維運人力配置如下：前端（FE）1 人天、後端（BE）16.25 人天、網站穩定性維運（SRE）3.5 人天、專案管理（PM）11.75 人天。
- 另預留彈性使用人力：前端（FE）2 人天、後端（BE）0.5 人天、網站穩定性維運（SRE）0.5 人天、專案管理（PM）2 人天，供處理突發性或非預期需求之用。
 - 第 25 項「(i5-11) 出題解題連結網址替換」已使用彈性人天，**剩餘可用人天共計前端（FE）1.5 人天、後端（BE）0.5 人天、網站穩定性維運（SRE）0.5 人天、專案管理（PM）1.75 人天。**
- 若有未刊載於工作項目列表中的新增需求，或需額外投入人力資源，經 Rytass 評估後，若超出上述彈性工時、或超出本案維運之範疇，由雙方開會協商處理方式，或透過需求變更程序處理，並依雙方確認之共識執行（詳見附件：專案需求變更程序）。

第參章 品質管控

（一）資安控管措施

1. ISO 27001 ISO/ IEC 27001

本專案遵循《資訊科技—安全技術—資訊安全管理系統—要求》（簡稱 ISO 27001 ISO/IEC 27001）是一套資訊安全管理的國際標準，建立本專案資訊安全管理系統的機密性、完整性與可用性。範疇包含本前述資訊安全管理制度建置、實施運作、監控審查、維護及持續改進期間，相關的文件與紀錄，均要適切的儲存與維護，並確保相關人員均可取閱最新的版本以確實遵循規範。本公司資訊安全管理制度文件架構包括一階文件至四階文件：

一階文件

係指針對資通服務及資訊安全管理制度之機能及主要程序，訂定本公司資訊安全政策及資訊安全管理制度運行之準則。本階文件包含資訊安全政策與手冊。

二階文件

資訊安全管理程序：係指訂定執行本公司資訊安全管理制度各項核心作業所涵蓋的活動。

三階文件

資訊安全作業辦法：係指訂定載明各單位或業務主體實施資訊安全相關政策、內部作業運作的作業辦法。

四階文件

資訊安全表單與紀錄：係指執行各項資訊安全管理活動時用來登錄執行相關規定之過程與結果所共訂定之空白表單及空白表單登錄後之紀錄。本階文件廣義上包含表單與紀錄報告及外來文件或資料（例如資訊安全相關法令規章）等文件。

（二）專案品質管控

專案品質控管目的，是為了確保所交付成果符合客戶端及相關利益關係人的期待與目標，意圖大幅減少專案進行期間的資源消耗，並實現預期成果最大化，更包含了以下目的：及時或加快速度交付成果、增強本專案成本的控制、提升交付品質、減少雙方往返溝通的時間和工項的報廢，減少使用者端的客服投訴，提升團隊生產力等。

參照專案管理知識體系指南（PMBOK Guide）²中的專案管理概念，採用以下概念作為專案管理之時的核心理論評估方向：

- **效能（Performance）**。評估交付成果是否按照項目團隊和利益關係人的意圖運作。
- **符合性（Conformity）**。評估交付成果是否符合規格。
- **可靠性（Reliability）**。評估交付成果是否每次執行或產出時產生一致的指標。
- **彈性（Resilience）**。評估交付成果是否能夠應對意外故障時能快速恢復。
- **滿意度（Satisfaction）**。評估交付成果是否引起最終使用者的正面反饋，包含使用者體驗及無障礙。
- **一致性（Uniformity）**。評估每次交付成果是否與以同樣方式產出的其他交付成果保持一致。
- **效率（Efficiency）**。評估交付成果團隊是否以最精簡的投入和產生最大化的成果。
- **可持續性（Sustainability）**。評估交付成果是否對經濟、社會和環境產生正面影響。

² 3.8 BUILD QUALITY INTO PROCESSES AND DELIVERABLES. From PMBOK-Guide-Seventh-Ed-PMI-2021

(三) 技術及資安風險基準

1. 技術框架：

Rytass 針對本案所採取之主要技術框架如下表：

範疇	採取技術/語言
前端	HTML / CSS / JavaScript
後端	PHP 5.6.40
主機環境	採用 GCP 規格如下： 伺服器規格：1 instance / E2-Nodes / 2 vCPU / 8GB RAM。 伺服器備份：最近 30 日 / 差異備份。
資料庫	資料庫規格：MySQL 5.7 資料庫備份：最近 7 日 / 全備份。 雲端伺服器期間：2025 年 6 月- 12 月

2. 資安規範

bsi. Certificate of Registration INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013 This is to certify that: Rytass Co., Ltd. No. 21, Ln. 72, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104016 Taiwan Holds Certificate No: IS 784307 and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 27001:2013 for the following scope: The provision of all business activities, including enterprise business operation and brand strategy consulting services, creative design services, marketing services, information system design, development, integration and maintenance services, network management and related supporting activities. This is in accordance with the Statement of Applicability, ISMS0103-013, version 1.3 dated 24 February 2023. For and on behalf of BSI:  Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC Original Registration Date: 2023-03-24 Effective Date: 2023-03-24 Latest Revision Date: 2023-03-24 Expiry Date: 2025-10-31    Page: 1 of 2 ...making excellence a habit.™ This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated here. Printed copies can be validated at www.bsi.com/clients/verify or telephone +886 (02)2656-0333. Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, 3-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C. A Member of the BSI Group of Companies.	Certificate No: IS 784307 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Location</th> <th>Registered Activities</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rytass Co., Ltd. No. 21, Ln. 72, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104016 Taiwan</td> <td>The provision of all business activities, including enterprise business operation and brand strategy consulting services, creative design services, marketing services, information system design, development, integration and maintenance services, network management and related supporting activities.</td> </tr> </tbody> </table> Original Registration Date: 2023-03-24 Effective Date: 2023-03-24 Latest Revision Date: 2023-03-24 Expiry Date: 2025-10-31 Page: 2 of 2 This certificate relates to the information security management system, and not to the products or services of the certified organisation. The certificate reference number, the mark of the certification body and/or the accreditation mark may not be shown on products or stated in documents regarding products or services. Provision material, advertisements or other documents showing or referring to this certificate, the trademark of the certification body, or the accreditation mark, must comply with the intention of the certificate. The certificate does not of itself confer immunity on the certified organisation from legal obligations. This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated here. Printed copies can be validated at www.bsi.com/clients/verify or telephone +886 (02)2656-0333. Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, 3-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C. A Member of the BSI Group of Companies.	Location	Registered Activities	Rytass Co., Ltd. No. 21, Ln. 72, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104016 Taiwan	The provision of all business activities, including enterprise business operation and brand strategy consulting services, creative design services, marketing services, information system design, development, integration and maintenance services, network management and related supporting activities.
Location	Registered Activities				
Rytass Co., Ltd. No. 21, Ln. 72, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104016 Taiwan	The provision of all business activities, including enterprise business operation and brand strategy consulting services, creative design services, marketing services, information system design, development, integration and maintenance services, network management and related supporting activities.				

美國國際電子商務顧問局（EC-Council）之資安證照

- 資訊安全管理系統 ISO 27001 為國際標準規範，系統地分析和管理資訊安全風險，適用各產業如何建置及獨立稽核驗證的資訊安全管理系統，並依循 PDCA 的管理循環建立、實作運作、審查、維持及改善資訊安全管理系統運作。
- Rytass 委託資拓宏宇執行導入專案，所有專案均已依照國際資安標準規範實施，由 BSI（英國國際標準協會）發布認證，並於 2023 年 3 月 24 取得認證並生效。
- 本案資安規範均符合乙方 ISMS 資安規範。委託方資安審核期程如造成專案延宕，不計入專案時程。

行政院國家資通安全會報認可



本案將由取得 CEH 白帽駭客認證同仁楊敘擔任資安品保人員

第肆章 執行時程規劃與成本控制

（一）期程規劃

本專案自 2025 年 5 月起展開，主要分為系統維運、無障礙網站維護與資訊安全性提升三大面向。各項工作依據工作計畫書所列期程執行，並於維運期間持續進行系統紀錄、安全稽核與使用者體驗改善，確保網站持續穩定運作並符合政府相關規範。各階段規劃期程及交付文件如下：

1. 系統維運與部署階段

本階段著重於系統部署與維運，並讓網站能維持穩定運作以維持政府相關規範，維運作業自專案啟動日起至 2025 年 12 月底止，主要涵蓋網站異動、SSL 網站憑證管理等作業，以及於本階段網站正式部署於 Google Cloud Platform (GCP)，由 Rytass 負責平台維護與資安管理。

- 交付文件：專案執行計畫書

2. 無障礙網站與標章維護階段

本專案將修正網站無障礙未通過項目以持續符合「無障礙網頁開發規範 2.1 AA 等級」，配合「我的 E 政府」網站進行複測申請與修正作業，直至通過為止，並更新現有版本標章（114-04-19）已到期標章。

- 交付文件：
 1. 無障礙檢測報告電子檔（至少 1 次）
 2. 最終無障礙標章圖示及申請通過證明文件

3. 資訊安全與弱點掃描、定期備份階段

此階段將會安排備份管理、還原演練，以及將原網址併入至新創圓夢網（<https://startup.sme.gov.tw/home/>）。並且依政府資通安全需求執行定期掃描，掃描後如發現中、高風險弱點，將進行修補或隔離（註：現有系統為 PHP 5.6.40，部分已知風險將不修補，並於報告中註明），以落實基本資安防護機制。

- 交付文件：弱點掃描電子檔形式報告（每年 2 次）

4. 功能改善與客製化需求

於網站維運期間，依可用彈性人天進行靜態文字調整，以及 Chatbot iframe 嵌入功能，協助提升互動性。

(二) 詳細工作期程表


階層	工作項目	備註	起始日	結束日	日曆天	工作天
1	Phase 1			-		-
開發	下架網頁x3、欄位內容x3		4/25	4/29	5	3
PM	交付專案執行計畫書		6/4	6/17	13	10
2	Phase 2：系統維運與部署階段			-		-
開發	部署轉移 GCP		5/14	5/31	17	13
開發	網站憑證管理（SSL憑證安裝）		5/21	6/6	16	13
3	Phase 3：無障礙網站與標章維護階段			-		-
開發	Bugs 修正（出題x3）、Footer 資訊更新		6/9	6/27	18	15
開發	系統備份-六月		6/30	7/4	4	5
開發	無障礙未通過項目修正x4		7/7	7/18	11	10
開發	加入 Chatbot iframe		7/14	7/25	11	10
開發	系統備份-七月		7/21	7/25	4	5
開發	無障礙掃描報告		7/21	8/1	11	10
開發	無障礙標章申請與維護		7/28	8/1	4	5
4	Phase 4：資訊安全與弱點掃描、每月定期備份階段					
開發	弱點掃描報告 I		8/4	8/8	4	5
開發	還原演練		8/11	8/15	4	5
開發	系統備份-八月		8/18	8/22	4	5
開發	系統備份-九月		9/15	9/19	4	5
開發	網址併入至新創圓夢網		9/29	10/3	4	5
開發	網站憑證管理（SSL憑證安裝）	遷移後重新申請	10/6	10/17	11	10
開發	系統備份-十月		10/13	10/17	4	5
開發	弱點掃描報告 II		10/20	10/24	4	5
驗收	資料、原始碼交付		12/1	12/10	9	8
驗收	第二期驗收、交付		12/1	12/10	9	8

(三) 交付項目表

編號	交付項目	交付內容	數量	交付型態	交付期限
1	專案執行計畫書	本文件	1	電子檔	6/10
2	維護紀錄	進行系統日常維護紀錄報告，包含項目： • 維護期間任何網站異動紀錄 • 系統備份紀錄（每月 1 次） • 還原演練（共 1 次） • 網站憑證管理（SSL 憑證安裝） • 網址跳轉服務	1	電子檔	12/10
3	無障礙掃描報告	提供無障礙掃描報告 2.1 AA，並更新標章	1	電子檔	8/1
4	弱點掃描報告	於維護期間，定期進行 2 次弱點掃描。	1	電子檔	10/24
5	資料、原始碼交付	完整交付甲方所有之系統資料、數據庫備份（格式應為通用或雙方議定之格式）、設定檔、憑證及相關文件。 乙方於本合約期間為甲方開發、修改或原屬甲方所有者，乙方應交付最新版本之完整原始碼及相關開發文件。	1	電子檔	12/10
6	第二期款驗收單 (結案驗收)	包含本案驗收成果之確認清單	1	電子檔	12/10

附件

專案需求變更程序

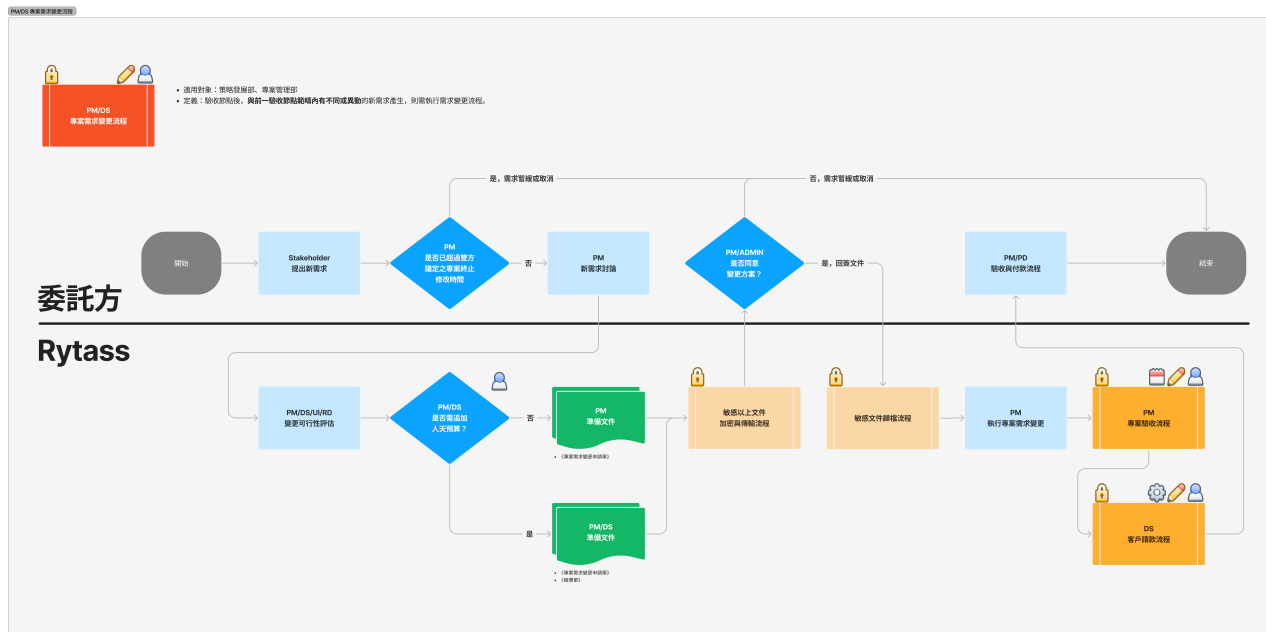

專案變更控制流程圖

當提出的對專案內容的修改構成實施範圍、費用、風險、品質、人員配備、功能或職責的實質性變更的情況下，必須採用專案變更控制程式中的描述。對於要求的變更評估和（或）執行可能導致合約價格、專案管理計畫、專案進度計畫表或其他本協定中內容的修改。

任何此類變更（如範圍變更）需要委託方和 Rytass 共同簽署才能進行需求變更。

以下的假設適用於：

- 任何對已同意的實施範圍的變更或與該範圍的偏離，或對本服務建議書、工作說明書或專案執行計畫書³中同意的時間或費用的變更都將遵循專案變更控制流程。
- 同意規格或需求的變更，代表雙方批准一項關於整體專案進度計畫、費用及功能的變更。

³ 以最新雙方議定版本為準。
